

Gerenciamento de Projetos Ágil

Alexandre Ribeiro Arantes

Alexandre.arantes@docente.unip.br

Apostila 01 – Agosto de 2026

Alexandre Ribeiro Arantes - Experiência Profissional

- Verão Vivo
- Circuito Banco do Brasil de Voleibol de Praia;
- Circuito Paulista de Voleibol de Praia;
- Circuito COSAT de Tennis - Banana Bowl;
- Copa Davis
- Sócio Gerente – DATA SPORT Sistemas de Informática;
- Federação Paulista de Tênis
- Confederação Brasileira de Tênis
- Confederação Brasileira de Volleyball
- Diretor Administrativo da Federação Paulista de Volleyball.
- Diretor Pedagógico do MBA em Gestão do Esporte na UNIP;
- Professor UNIP desde 2007

Alexandre Ribeiro Arantes - Experiência Acadêmica

- Bacharel em Administração de Empresas (UNITAU);
- Licenciatura em Matemática (ETEP)
- Pós graduado em Gestão do Esporte – (Trevisan);
- Pós Graduado em Gerente de Cidade – (FAAP);
- Pós Graduado em Educação a distância (UNIP);
- Pós Graduação em Inteligência Artificial (METROPOLITANA)
- Mestre em Ciências com ênfase em Gestão do Conhecimento (EEFE/USP);
- Lider da disciplina Organização de Campeonatos e Eventos Esportivos – UNIP;
- Pesquisador – Grupo de pesquisa em Gestão do Esporte (GEPAE/USP);
- Membro da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC);

I – EMENTA

Este curso aborda os princípios e práticas de gerenciamento de projetos ágeis, explorando frameworks como Scrum, Kanban e Lean, além de ferramentas e técnicas para planejamento, execução e monitoramento de projetos com foco em flexibilidade e entregas incrementais. O curso capacita os alunos a gerenciar equipes e projetos de TI utilizando métodos ágeis, visando a adaptação rápida às mudanças e a entrega contínua de valor.

II – OBJETIVOS

O objetivo geral deste curso é capacitar os alunos a entenderem e aplicarem as metodologias ágeis no gerenciamento de projetos, especialmente em ambientes de TI. O curso visa desenvolver competências para planejar, executar e monitorar projetos de forma ágil, garantindo a entrega contínua de valor ao cliente e a adaptação rápida às mudanças nos requisitos.

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O curso busca proporcionar aos alunos uma compreensão prática das principais metodologias ágeis, como Scrum, Kanban e Lean, capacitando-os a utilizá-las para gerenciar projetos de software e TI. Os alunos aprenderão a organizar sprints, priorizar backlogs, realizar reuniões diárias de acompanhamento e monitorar o progresso de seus projetos com ferramentas apropriadas.

IV – COMPETÊNCIAS

Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de:

- Aplicar os conceitos de Scrum, Kanban e Lean no gerenciamento de projetos ágeis.
- Planejar, executar e monitorar projetos de forma incremental e flexível.
- Priorizar atividades com base em valor entregue ao cliente.
- Facilitar a colaboração e comunicação em equipes multidisciplinares, promovendo a melhoria contínua dos processos.

V. Conteúdo Programático

Fundamentos do Gerenciamento de Projetos Ágil:

1.1. Introdução ao Manifesto Ágil e Princípios

- Valores e princípios do Manifesto Ágil
- Comparação entre gerenciamento tradicional e ágil

1.2. Benefícios e Desafios do Gerenciamento Ágil

- Quando adotar práticas ágeis
- Desafios na transição de métodos tradicionais para ágeis
- Scrum: Estrutura e Aplicação

2.1. Estrutura e Papéis no Scrum

- Papéis: Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento
- Artefatos: Backlog, Sprint, Incremento.

V. Conteúdo Programático

Fundamentos do Gerenciamento de Projetos Ágil:

2.2. Ciclo de Vida do Scrum

- Sprint planning, daily meetings, sprint review e sprint retrospective
- Definição de prontos e entregas incrementais
- Kanban: Gestão Visual e Controle de Fluxo

3.1. Fundamentos do Kanban

- Conceitos de Kanban: fluxo contínuo e visualização de tarefas
- Limitação de trabalho em andamento (WIP)

3.2. Implementação de Quadros Kanban

- Utilização de quadros Kanban para gerenciar projetos
- Ferramentas digitais de Kanban (Trello, Jira, Azure DevOps)
- Planejamento Ágil e Priorização de Backlog

V. Conteúdo Programático

4.1. Técnicas de Priorização e Planejamento Ágil

- Estimativas ágeis: Planning Poker e T-shirt sizing
- Priorização de backlog baseada em valor e urgência

4.2. Gestão de Expectativas com Stakeholders

- Comunicação com stakeholders em projetos ágeis
- Gestão de mudanças no backlog e no escopo
- Lean e Desenvolvimento Enxuto

5.1. Princípios do Lean no Gerenciamento de Projetos

- Eliminação de desperdícios e entrega contínua de valor
- Redução de lead time e ciclos curtos de feedback

V. Conteúdo Programático

5.2. Kaizen e Melhoria Contínua

- Aplicação do ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act)
- Melhoria contínua e a cultura de experimentação
- Monitoramento e Controle de Projetos Ágeis

6.1. Métricas Ágeis e Monitoramento de Progresso

- Métricas de desempenho: Velocidade, Burndown e Burnup charts
- Ferramentas para acompanhamento de projetos ágeis

6.2. Gestão de Riscos em Projetos Ágeis

- Identificação e mitigação de riscos em ambientes ágeis
- Resolução de impedimentos e gestão de crises
- Ferramentas para Gerenciamento Ágil

V. Conteúdo Programático

7.1. Ferramentas Digitais de Suporte ao Scrum e Kanban

- Utilização de Jira, Trello, Azure DevOps para gerenciar projetos
- Integração de ferramentas ágeis com outros sistemas

7.2. Automação de Processos no Gerenciamento Ágil

- Automação de tarefas repetitivas e monitoramento de fluxos de trabalho
- Continuous Integration e Continuous Delivery (CI/CD)
- Estudos de Caso e Aplicação Prática

8.1. Estudos de Caso em Projetos Ágeis

- Análise de projetos de sucesso em empresas utilizando metodologias ágeis

8.2. Desenvolvimento de Projeto Prático

- Simulação de um projeto real utilizando Scrum e Kanban
- Aplicação das técnicas e ferramentas ágeis estudadas

VI – ESTRATÉGIA DE TRABALHO

As aulas são predominantemente em metodologia ativa de ensino, apoiadas nas diretrizes do plano de ensino.

O desenvolvimento dos conceitos e conteúdos ocorre com apoio de bibliografia, propostas de leituras, exercícios, textos complementares, discussões no fórum/chats, sugestão de literatura e filmes quando possível.

Em conjunto com a atividade do professor da disciplina, ocorre o fórum para aprofundar discussões relevantes a cada disciplina.

Com o objetivo de aprofundar o conteúdo programático e incentivar a pesquisa, o docente pode utilizar recursos como: artigos científicos, trabalhos individuais ou em grupo e palestras que permitam aos alunos compreenderem na prática a teoria apresentada.

VII – AVALIAÇÃO

A avaliação será obtida por meio de provas, trabalhos e seminários, dentre outros, bem como pela participação do aluno durante as aulas e demais atividades, a critério do professor e em conformidade com o respectivo plano de ensino. Serão feitas avaliações, assim distribuídas:

Duas Notas do Professor (NP) para as atividades curriculares, com peso 4 (quatro) cada uma, na composição da nota semestral de cada disciplina;

Uma nota referente ao Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM). Esse Projeto será desenvolvido durante o semestre.

Para a aprovação, a MS deverá ser igual ou superior a 7,0; é exigida a frequência mínima de 75%. O desempenho do aluno é avaliado numa escala de 0 (zero) a 10 (dez).

Manual de Informações Acadêmicas e Calendário Escolar - Cursos Superiores de Tecnologia - Universidade Paulista - UNIP

VIII - BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

- KERZNER, H. Gestão de projetos: as melhores práticas, 2./4.ed. Bookman, 2010/2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/>. Acesso em: 29 jul. 2023.
- PMI Project Management Institute. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®). 5.ed. Saraiva. São Paulo, 2013/2014. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/>. Acesso em: 29 jul. 2023.
- VARGAS, R. V. Gerenciamento de projetos. 6. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2005/2016. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 29 jul. 2023.

VIII – BIBLIOGRAFIA - COMPLEMENTAR

- WYSOCKI, Robert K.; MARQUES, Arlete S. Gestão eficaz de projetos (vol 1): como gerenciar com excelência projetos tradicionais, ágeis e extremos (Effective Project Management). São Paulo: Editora Saraiva, 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/>. Acesso em: 29 jul. 2023.
- WYSOCKI, Robert K.; MARQUES, Arlete S. Gestão eficaz de projetos (vol 2). São Paulo: Editora Saraiva, 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/>. Acesso em: 29 jul. 2023.
- GRAY, C. F. Gerenciamento de Projetos. o processo gerencial, 6. ed. Porto Alegre. AMGD, 2016. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/>. Acesso em: 29 jul. 2023.
- VAZQUEZ, C. E.; SIMÕES, G. S.; ALBERT, R. M. Análise de pontos de função: medições, estimativas e gerenciamento de projetos de software. 3. ed. São Paulo: Érica, 2017. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/>. Acesso em: 29 jul. 2023.
- PAULA FILHO, W. de P. Engenharia de software: fundamentos, métodos e padrões. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
- FOGGETTI, C. Gestão ágil de projetos. Pearson: São Paulo, 2015. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 29 jul. 2023.

1. O que é um projeto?

Antes de falar em agilidade, precisamos entender o objeto da gestão.

Projeto

Esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.

Gerenciamento de projetos

Aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos.

Pergunta-chave

É possível planejar completamente um projeto de software antes de começar a desenvolvê-lo?

2. A resposta: não completamente

Em software, parte relevante do conhecimento surge durante a execução.

Cliente aprende

Novas necessidades aparecem quando o produto começa a ser visto e testado.

Usuário reage

O uso real revela dificuldades, prioridades e funcionalidades pouco úteis.

Tecnologia muda

Integrações, riscos e limitações técnicas podem surgir no desenvolvimento.

Contexto muda

Mercado, legislação, concorrência e estratégia podem alterar o projeto.


Planejar continua sendo necessário. O planejamento, porém, deve ser progressivo, revisável e orientado por feedback.

A maneira como o mundo funciona está errada.

- Qual foi o principal problema do projeto?
- O fracasso ocorreu por falta de planejamento?
- Que sinais mostram que o projeto estava distante da entrega de valor?

3. Caso FBI: quando o plano não encontra a realidade

Projeto Sentinel — planejamento extenso, alto custo e baixo valor entregue.

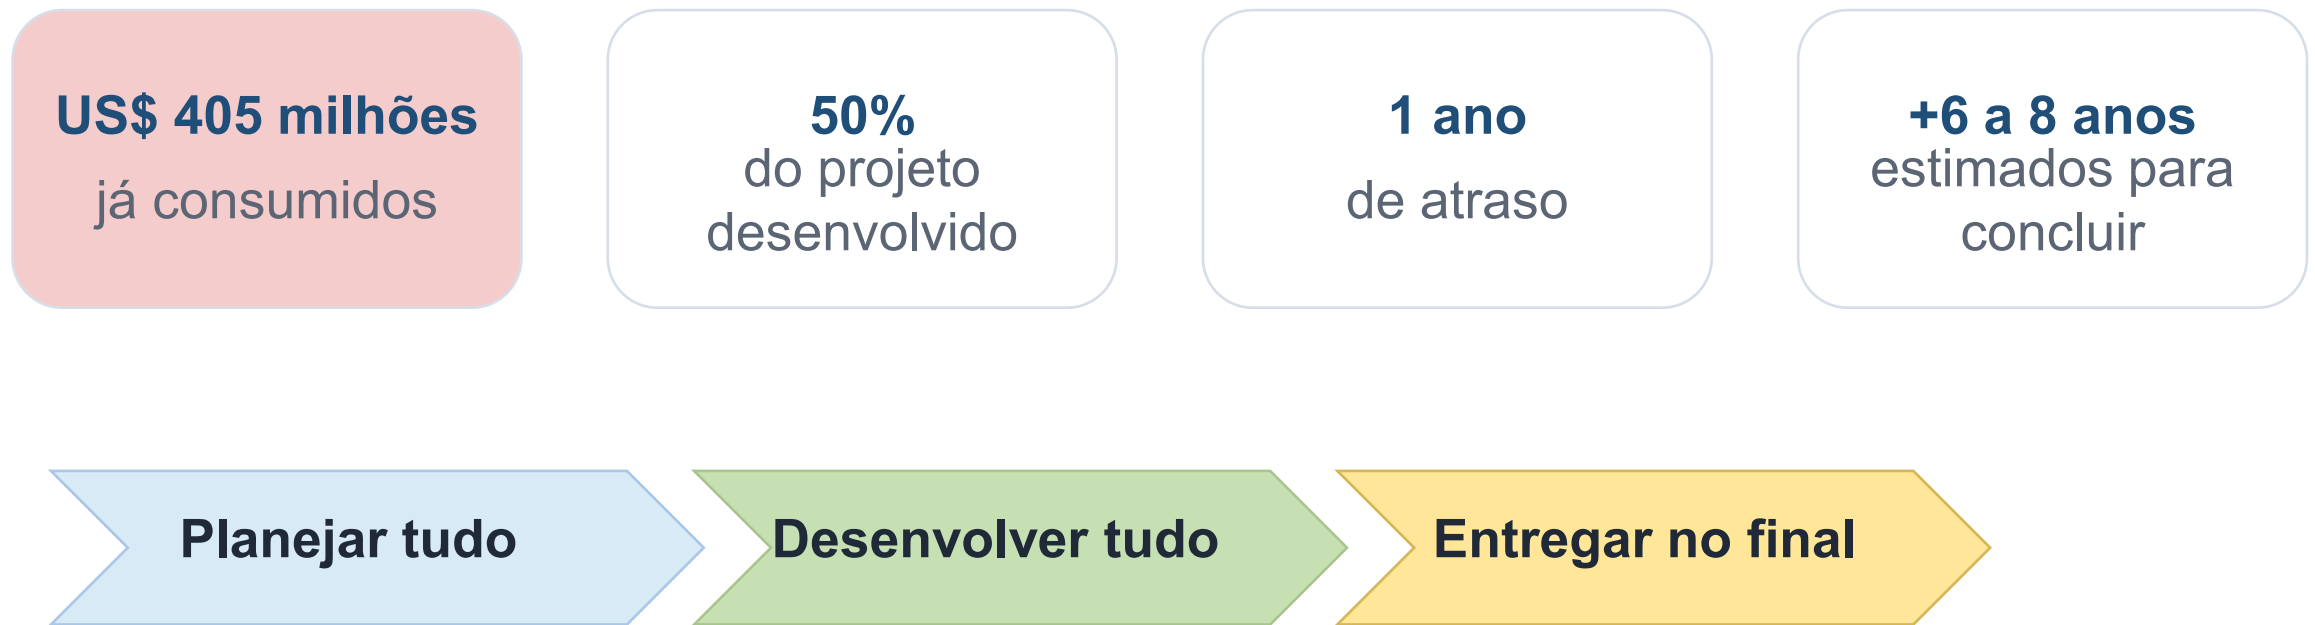

Problema central: o avanço era medido pelo plano e pelas tarefas — não por software utilizável e valor entregue.

4. Por que surgiu o Manifesto Ágil?

Uma resposta aos projetos longos, rígidos e distantes do usuário.

Lógica preditiva rígida

- Requisitos tratados como definitivos
- Cliente participa pouco durante a execução
- Testes e validação tardios
- Mudanças vistas como desvio
- Valor concentrado na entrega final

Lógica ágil

- Requisitos evoluem com aprendizagem
- Cliente participa continuamente
- Entregas pequenas e frequentes
- Mudanças geram adaptação
- Valor entregue progressivamente

5. Os quatro valores do Manifesto Ágil

Os elementos à direita têm valor — os da esquerda recebem maior prioridade.

Indivíduos e interações

mais que

processos e ferramentas

Software funcionando

mais que

documentação abrangente

Colaboração com o cliente

mais que

negociação de contratos

Resposta às mudanças

mais que

seguir um plano

6. Doze princípios, quatro ideias centrais

Uma síntese para orientar projetos de software.

Entregar valor

- Satisfazer o cliente
- Entregar cedo e frequentemente
- Medir progresso por produto funcionando

Adaptar

- Aceitar mudanças
- Revisar prioridades
- Aprender a cada ciclo

Colaborar

- Aproximar negócio e equipe
- Comunicação direta
- Confiança e autonomia

Melhorar

- Ritmo sustentável
- Qualidade técnica
- Retrospectivas

Agilidade = ciclos curtos de entrega + feedback + aprendizagem + repriorização.

7. Tradicional x ágil: não é uma disputa

A abordagem deve ser coerente com o nível de incerteza do projeto.

Aspecto	Tradicional / preditivo	Ágil
Planejamento	Detalhado no início	Progressivo e revisado
Escopo	Busca maior estabilidade	Pode evoluir
Entregas	Fases ou entrega final	Incrementos frequentes
Cliente	Participação pontual	Participação contínua
Mudança	Controlada como desvio	Incorporada à aprendizagem
Controle	Aderência ao plano	Valor, fluxo e feedback

Métodos híbridos combinam previsibilidade e adaptação conforme o contexto.

7. Tradicional x ágil: não é uma disputa

A abordagem deve ser coerente com o nível de incerteza do projeto.

Aspecto	Tradicional / preditivo	Ágil
Planejamento	Detalhado no início	Progressivo e revisado
Controle	Aderência ao plano	Valor, fluxo e feedback

Uma das principais características da abordagem ágil é combinar a interação contínua com o cliente com ciclos iterativos de desenvolvimento, permitindo receber feedback, aprender e adaptar o projeto ao longo de sua execução.”

Métodos híbridos combinam previsibilidade e adaptação conforme o contexto.

Faça uma coisa de cada vez!

Gerenciar muitas atividades ao mesmo tempo não significa gerenciar bem um projeto.

O objetivo não é iniciar mais tarefas. É concluir entregas que gerem valor.

Elaboração de Projetos

Escreva os números de 1 a 10, os numerais romanos de 1 a 10 (I, II, III, IV etc.) e as letras de A a J. Cronometre o tempo. O objetivo é terminar o mais rápido possível.

Mas da primeira vez, peço que o faça nesta ordem: escreva o numeral arábico, em seguida o numeral romano e, por último, a letra, de forma que seu papel fique assim:

1	I	A
2	II	B
3	III	C

Gerenciamento de Projetos Ágil

NÚMERO DE PROJETOS SIMULTÂNEOS	PORCENTAGEM DE TEMPO DISPONÍVEL PARA CADA PROJETO	PERDA CAUSADA PELA MUDANÇA DE CONTEXTO
1	100%	0%
2	40%	20%
3	20%	40%
4	10%	60%
5	5%	75%

Use os percentuais como estimativa ilustrativa, não como regra universal. O impacto real varia conforme complexidade, interrupções e tipo de trabalho.

Fonte (Weinberg, Gerald M.)

- Talvez você tenha que trabalhar por horas para voltar ao mesmo estado de consciência. Esse é o custo!
- Quando não temos mais nenhuma reserva de energia, ficamos propensos a tomar decisões inadequadas.

8. Atividade de abertura — vamos decidir como desenvolver este projeto

Projeto: sistema de inscrições para competições esportivas.

Uma organização esportiva quer criar uma plataforma para cadastro, pagamento, categorias, ranking e comunicação com atletas.

- 1. É possível definir todos os requisitos antes do desenvolvimento?
- 2. Qual funcionalidade deveria ser entregue primeiro?
- 3. Que mudanças podem surgir após o primeiro teste?
- 4. Como os atletas participariam da avaliação?
- 5. O projeto seria tradicional, ágil ou híbrido?

Fechamento: agilidade não elimina o planejamento; impede que o plano deixe de aprender com a realidade.

9. O planejamento no ágil aprende com a realidade

Em contextos incertos, não planejamos tudo em detalhes; aprendemos o suficiente para avançar.



No ágil, o conhecimento cresce durante o projeto.
Por isso, o plano evolui com a realidade.

Fechamento: agilidade não elimina o planejamento;
ela reconhece que o planejamento também precisa aprender.

10. Interação e iteração: conceitos complementares

No ágil, aprender com o cliente depende dos dois movimentos.



Interação

- Contato contínuo com cliente e stakeholders
- Escuta, alinhamento e colaboração
- Avaliação do que foi entregue
- Feedback para orientar decisões



Iteração

- Ciclos curtos de trabalho
- Entregas incrementais e frequentes
- Revisão e melhoria contínua
- Ajustes a cada novo aprendizado



Interação gera feedback. Iteração transforma esse feedback em melhoria.

Fechamento: quanto menor o intervalo entre a entrega e o feedback, maior a capacidade de aprender e corrigir o projeto.

11. MVP, backlog e priorização


Três conceitos centrais para decidir o que entregar primeiro.



Fechamento: no ágil, não se entrega tudo primeiro; entrega-se primeiro aquilo que ajuda a aprender e gerar valor.

12. Conhecimento explícito e tácito no projeto ágil

O projeto não entrega apenas resultados; ele também cria conhecimento.

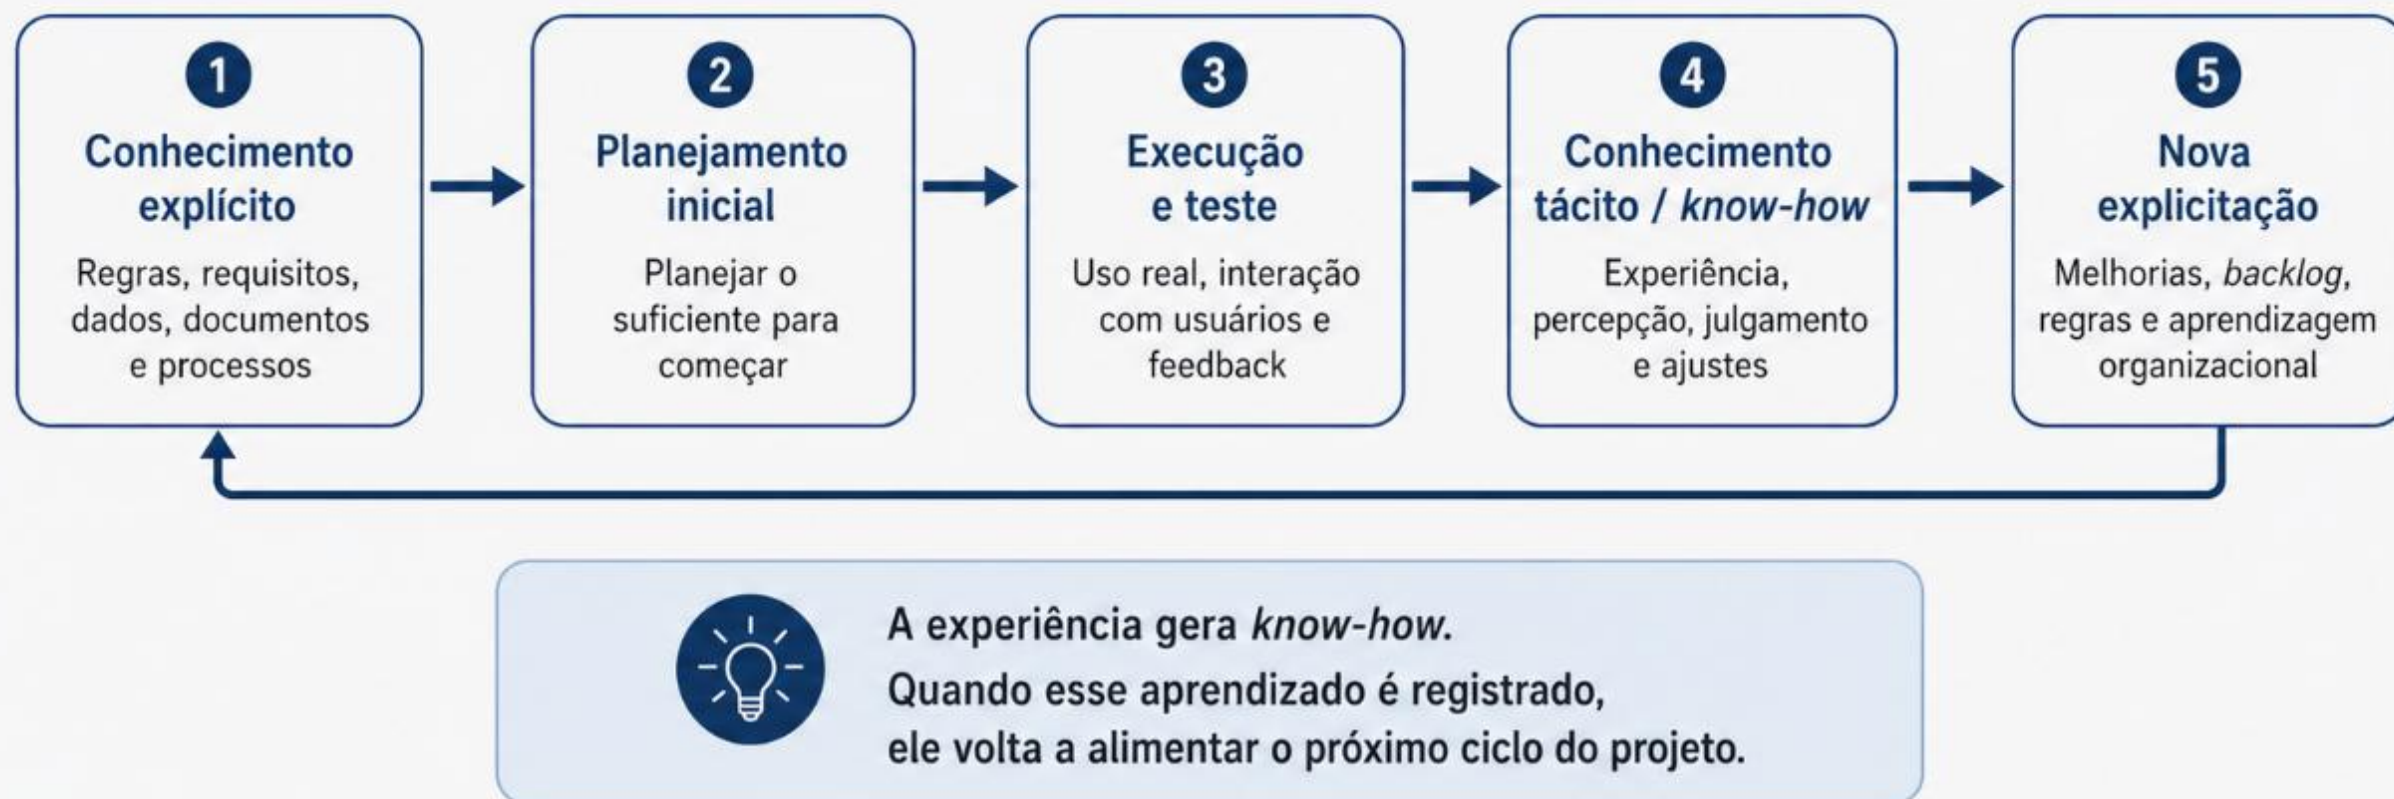

Fechamento: o conhecimento disponível muda; por isso, o planejamento também muda.

Se o conhecimento sobre o projeto muda durante sua execução, o que deve acontecer com o planejamento?

Referências

Bibliografia do plano de ensino e estudo de caso utilizado na aula.

- FOGGETTI, C. Gestão ágil de projetos. São Paulo: Pearson, 2015.
- PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®). 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
- SUTHERLAND, J. Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Rio de Janeiro: Sextante, 2019.
- WYSOCKI, R. K.; MARQUES, A. S. Gestão eficaz de projetos: como gerenciar com excelência projetos tradicionais, ágeis e extremos. São Paulo: Saraiva, 2020.
- KERZNER, H. Gestão de projetos: as melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 2020.

Ideia central: entregar valor cedo, aprender rápido e adaptar o projeto.

Gerenciamento de Projetos Ágil

Alexandre Ribeiro Arantes

Alexandre.arantes@docente.unip.br

Apostila 01 – Agosto de 2026
